Id		Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
1			CANTEIRO	14 dias	Sex 01/03/19	Qua 13/03/19
2			PROJETOS	20 dias	Sex 01/03/19	Seg 18/03/19
3			**MÓDULO 1**	**121 dias**	**Qua 13/03/19**	**Sáb 29/06/19**
4			Demolição	30 dias	Qua 13/03/19	Ter 09/04/19
5			Fundação	7 dias	Ter 09/04/19	Seg 15/04/19
6			Estrutura em Alvenaria Estrutural	21 dias	Seg 15/04/19	Sáb 04/05/19
7			Contrapiso	7 dias	Sáb 04/05/19	Sex 10/05/19
8			Cobertura	14 dias	Sex 10/05/19	Qua 22/05/19
9			Hidraulica	21 dias	Qua 22/05/19	Seg 10/06/19
10			Eletrica	21 dias	Qua 22/05/19	Seg 10/06/19
11			Esquadrias	14 dias	Qua 22/05/19	Ter 04/06/19
12			Revestimento	21 dias	Seg 10/06/19	Sáb 29/06/19
13			**MÓDULO 2**	**74 dias**	**Sáb 29/06/19**	**Seg 02/09/19**
14			Demolição	7 dias	Sáb 29/06/19	Sex 05/07/19
15			Alvenaria	7 dias	Sex 05/07/19	Qui 11/07/19
16			Contrapiso	7 dias	Sex 05/07/19	Qui 11/07/19
17			Cobertura	18 dias	Qui 11/07/19	Sáb 27/07/19
18			Hidráulica	18 dias	Sáb 27/07/19	Seg 12/08/19
19			Elétrica	18 dias	Sáb 27/07/19	Seg 12/08/19
20			Esquadrias	10 dias	Sáb 27/07/19	Seg 05/08/19
21			Revestimento	22 dias	Seg 12/08/19	Dom 01/09/19
22			Complementos	2 dias	Dom 01/09/19	Seg 02/09/19

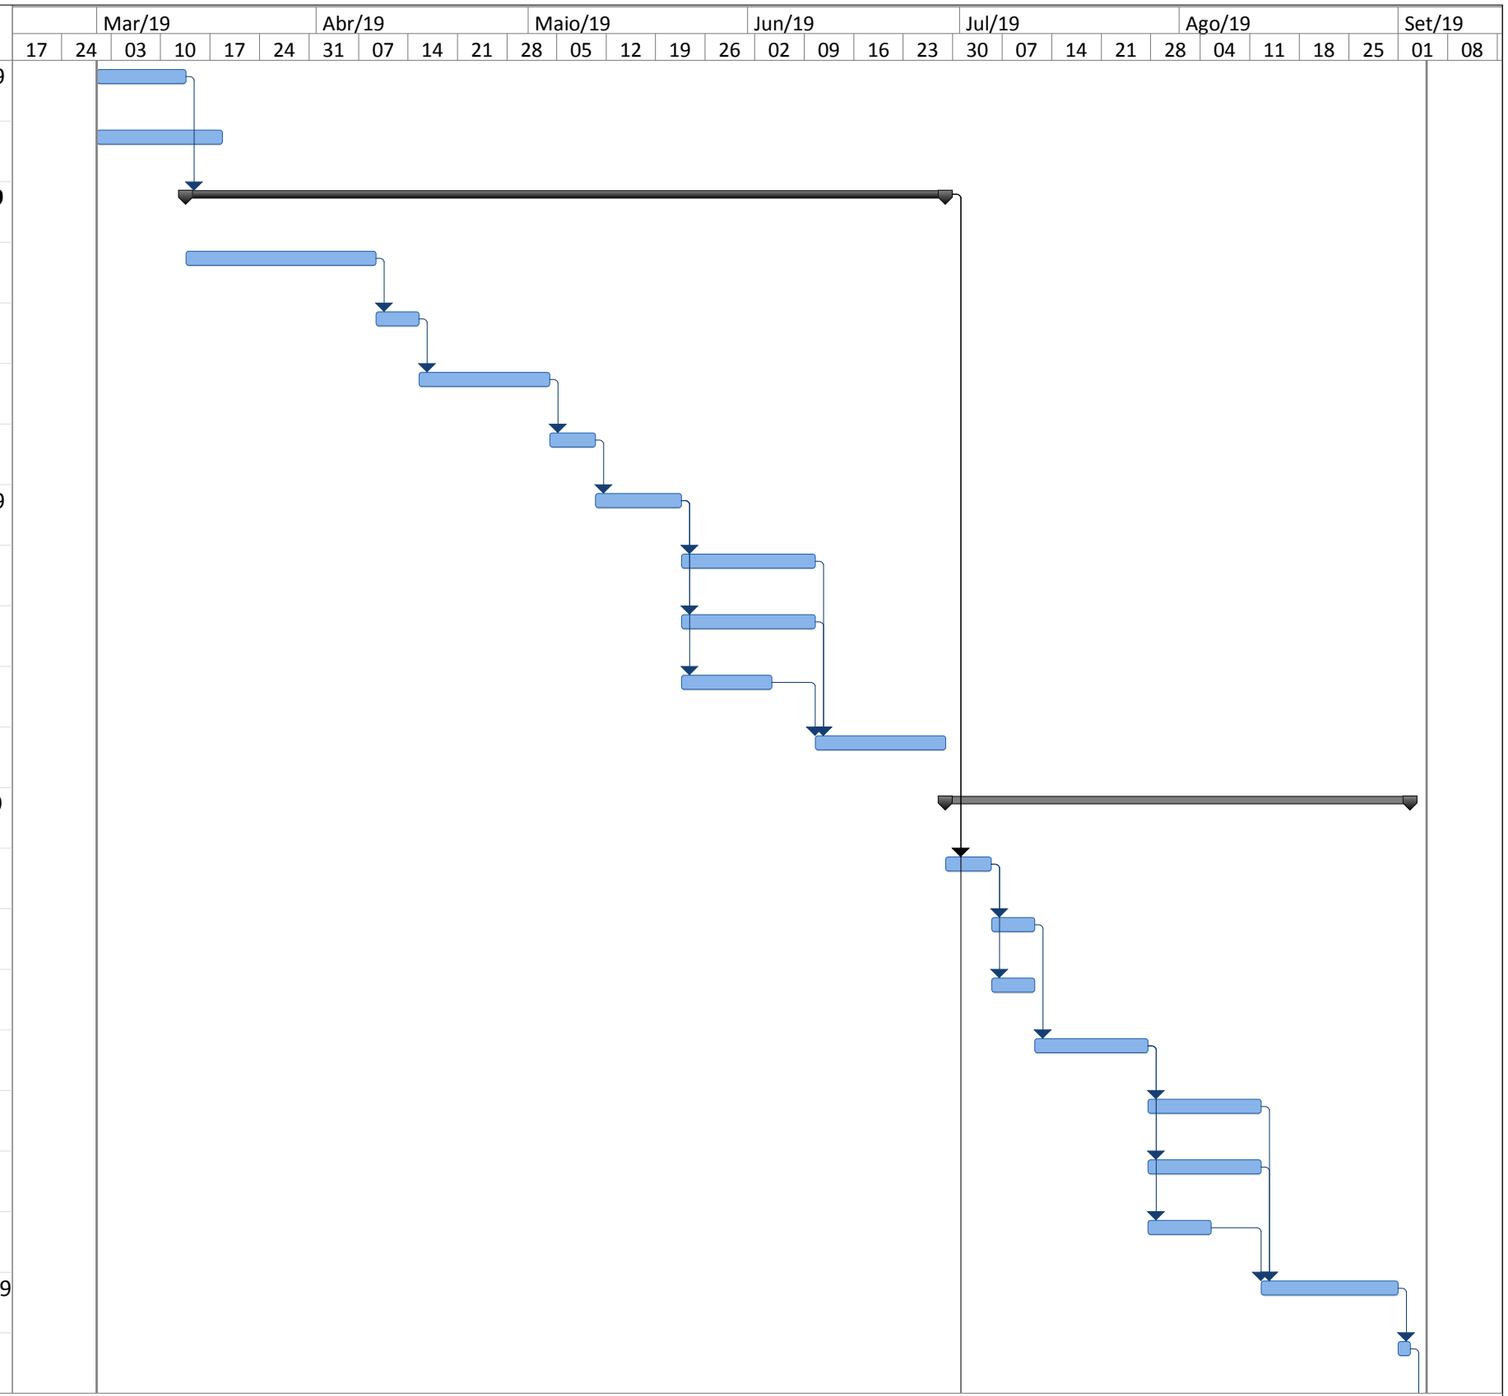

Projeto: Cronograma -Reforma da
Data: Qua 23/01/19

Tarefa	Tarefas externas	Tarefa Manual	Somente término
Divisão	Etapa externa	Somente duração	Data limite
Etapa	Tarefa Inativa	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo	Etapa Inativa	Resumo Manual	
Resumo do projeto	Resumo Inativo	Somente início	

Id		Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
23			**CANIL**	**19 dias**	**Sáb 29/06/19**	**Ter 16/07/19**
24			Fundação	4 dias	Sáb 29/06/19	Ter 02/07/19
25			Alvenaria	7 dias	Ter 02/07/19	Seg 08/07/19
26			Cobertura	3 dias	Ter 09/07/19	Qui 11/07/19
27			Revestimento	5 dias	Qui 11/07/19	Ter 16/07/19
28			LIMPEZA	2 dias	Ter 03/09/19	Qua 04/09/19

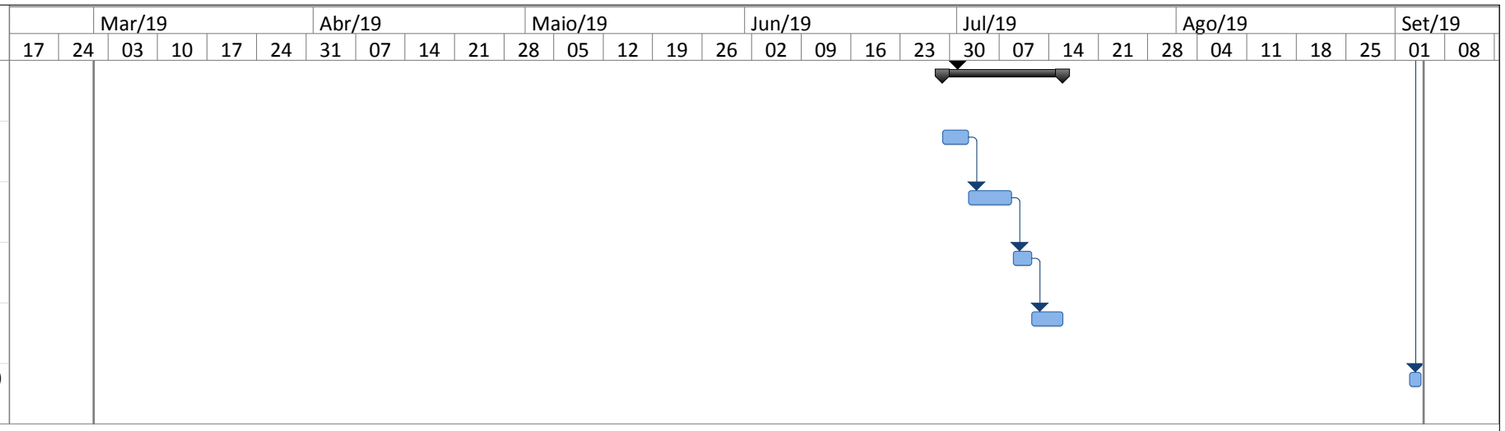

Projeto: Cronograma -Reforma da
Data: Qua 23/01/19

Tarefa		Tarefas externas		Tarefa Manual		Somente término	
Divisão		Etapa externa		Somente duração		Data limite	
Etapa		Tarefa Inativa		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo		Etapa Inativa		Resumo Manual			
Resumo do projeto		Resumo Inativo		Somente início			
